


**PRACOVNÍ MÍSTO**

- v řešeném místě proběhne rekonstrukce potrubí tepelných rozvodů
- nové potrubí bude kladeno do výkopů
- průběh výkopových prací bude postupně řešen dle detailů D1 - D5-II, hlavní mapa zobrazuje stav po dokončení všech výkopů
- pracovní místa s výkopky budou oplocena mobilními drátěnými plotovými dílci umožňujícími průhled řidičům, v rozhraní s chodníkem budou podél oplocení umístěny zábrany Z2, v rozhraní s vozovkou budou podél oplocení umístěny směrovací desky Z4
- v místech, kde bude výkop umístěn v chodníku, bude přes něj umístěna přechodová lávka, případně se umístí podél výkopu do vozovky nebo zeleně
- takto zřízené obchůzky plochy nebo koridory v rámci vozovky budou mít průchozí šířku min. 1,5 m
- přes výkopky ve vozovce budou umístěny přejezdové plochy
- v místě záborů ve vozovce bude zachována průjezdná šířka min. 3,0 m - provoz bude usměrňován DZ P7 a P8, délka záboru na komunikaci max. 15 m
- zařízení stavby bude umístěno na slepém konci parkovací plochy a bude oploceno (viz situace)
- vykopaná zemina bude před zasypáním výkopů dočasně skladována na několika místech v blízkosti pracovních míst (viz situace)
- skládka sypkého materiálu a potrubí bude umístěna na slepém konci parkovací plochy (viz situace)
- kvůli skládce, záborům pro pracovní místa a zúžení v některých místech dotčených místních komunikací bude vyklizeno několik parkovacích stání
- vyklizecí DZ B28+E13+E8 bude v místech záborů

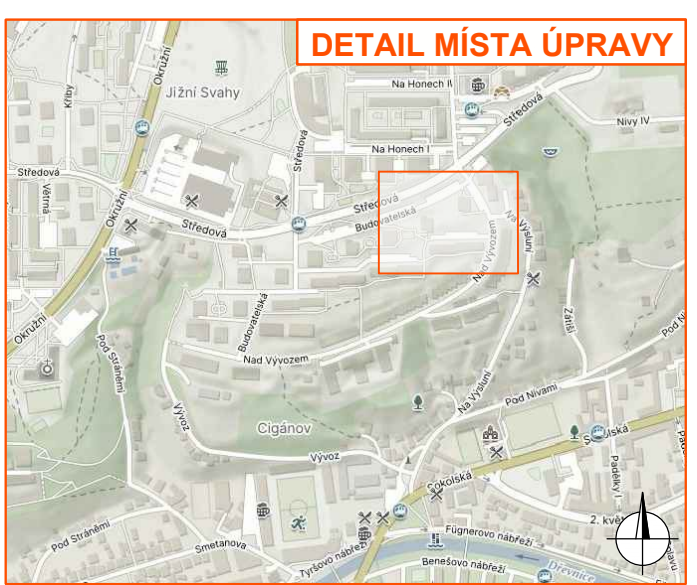

**DETAIL D1**

- výkop bude probíhat v chodníku
- chodník bude v dotčeném místě uzavřený
- podél chodníku bude umístěna zpevněná plocha š. 1,5 m

**DETAIL D2**

- výkop bude probíhat v chodníku
- chodník bude v dotčených místech uzavřený
- podél chodníku bude umístěna zpevněná plocha š. 1,5 m
- na konci parkoviště bude vyklizena plocha pro skládku sypkého materiálu a potrubí
- vyklizecí dopravní značení DZ B28+E13+E8 bude osazeno týden před zahájením stavebních prací

**DETAIL D3-I, D3-II**

- výkop bude probíhat v místní komunikaci a chodníku (D3-II)
- podél záboru bude zachována průjezdná šířka min. 3,0 m, ve zúžení bude osazeno DZ P7 a P8
- vyklizecí dopravní značení DZ B28+E13+E8 bude osazeno týden před zahájením stavebních prací

**DETAIL D4-I**

- výkop bude probíhat v chodníku, který bude uzavřen

**DETAIL D4-II**

- výkop bude probíhat v chodníku, který bude uzavřen
- bude vytvořen koridor pro chodce š. 1,5 m v místě park. stání podél místní komunikace Nad Vývozem
- vyklizecí dopravní značení DZ B28+E13+E8 bude osazeno týden před zahájením stavebních prací

**DETAIL D5-I, D5-II**

- výkop bude probíhat v místní komunikaci
- podél záboru bude zachována průjezdná šířka min. 3,0 m, ve zúžení bude osazeno DZ P7 a P8
- vyklizecí dopravní značení DZ B28+E13+E8 bude osazeno týden před zahájením stavebních prací

