

ZŠ Lukov – výstavba specializovaných učeben



ZÁKLADNÍ
ŠKOLA



Časový rozsah projektu

- **červen 2021** Zastupitelstvo obce Lukov rozhodlo o přípravě projektu
- **březen 2022** projekt pro SP + zpracování realizační dokumentace
- **29. září 2022** pravomocné stavební povolení
- **listopad 2022** výběrové řízení na stavbu – ukončeno **v únoru 2023**
- **duben 2023** zahájení stavby **od února 2023** – posunutí termínu **na květen 2023**
- **duben 2024** výběrové řízení na vybavení – ukončeno **v srpnu 2024**
- **listopad 2024** vybavení – dokončeno
- **ITI** **4. října 2023** – vyjádření o souladu
- **IROP** **19. října 2023** – žádost o podporu
- **IROP** **28. března 2024** – Právní akt
- **IROP** **červenec 2024** – zpracování žádosti o platbu – **říjen 2024** – snad už konečné odsouhlasení členění projektu na způsobilé a nezpůsobilé výdaje

Financování

- stavba dle projektu před soutěží – **72.000.000 Kč**
- vysoutěženo **55.240.000 Kč**
- vybavení 7 učeben a šatny – dle projektu **12.000.000 Kč**
- navýšení během stavby o **3.120.000 Kč** na **58.360.000 Kč**
- náklady na projekt **1.600.000 Kč**, TDS, BOZP, AD – **2.400.000 Kč**
- vybavení vysoutěženo za – **11.000.000 Kč**
- náklady na vybavení původních tříd mimo projekt cca **2.000.000 Kč**

Financování

■ dotace z ITI 55.500.000 Kč

■ dotace SR 3.264.705 Kč

■ celkem dotace 58.764.705 Kč

■ celkové náklady 75.360.000 Kč

■ celkové dotace – 58.764.705 Kč

■ podíl OÚ Lukov 16.595.295 Kč



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Seznam předložených strategických projektů

■ Výzva – č. 4

■ Název výzvy – Základní školy

■ Operační program – Integrovaný regionální program

■ Alokace výzvy v Kč – 150 769 229,03

Pořadí	Název strategického záměru	Předkladatel	Vývoj požadovaných alokací						Varianty řešení dle Interních postupů
			Požadovaná alokace původně předložených PZ v Kč	Bodové hodnocení	Alokace po 14. ŘV	Rozdíl v Kč	Požadovaná alokace do výzev nositele v Kč	Rozdíl	Domluva předkladatelů z PS
1	ZŠ Lukov – výstavba specializovaných učeben	Obec Lukov	75 923 705,96	51	58 000 000,00	17 923 705,96	58 000 000,00	17 923 705,96	55 500 000,00
2	Výstavba vzdělávacího centra pro potřeby ZŠ JINOTAJ. Strategický projekt implementace integrované tematické výuky (ITV) v nových odborných učebnách	Základní škola JINOTAJ Zlín, s.r.o.	48 450 000,00	48	48 000 000,00	450 000,00	48 000 000,00	450 000,00	45 500 000,00
3	ZŠ Mysločovice – venkovní učebna, konektivita školy, rekonstrukce a modernizace odborných učeben	Obec Mysločovice	13 241 826,50	48	13 000 000,00	241 826,50	13 000 000,00	241 826,50	11 500 000,00
4	Modernizace ZŠ M. Alše a ZŠ Štípa za účelem vybudování odborných učeben	Statutární město Zlín	90 000 000,00	47	76 109 000,00	13 891 000,00	59 432 000,00	30 568 000,00	38 269 229,03
Celkem			227 615 532,46		195 109 000,00		178 432 000,00		150 769 229,03

0,00

Čerpání alokace

150,97%

129,41%

118,35%




Vzhled školy na počátku stavebních prací (květen 2024).






Stavební práce.



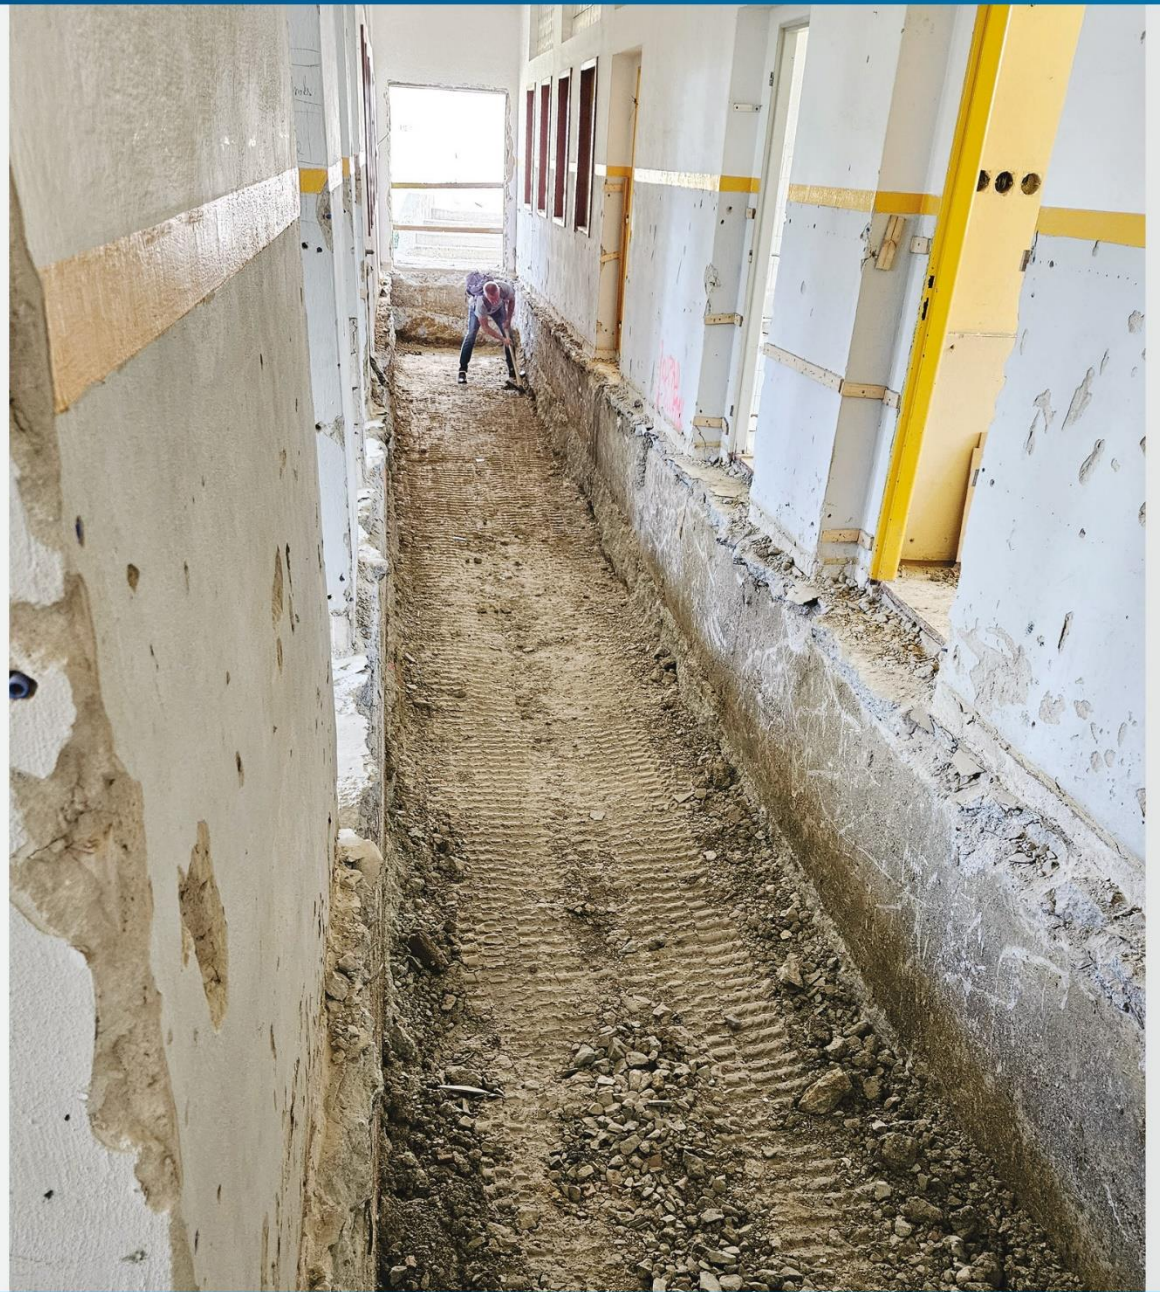

Stavební práce.


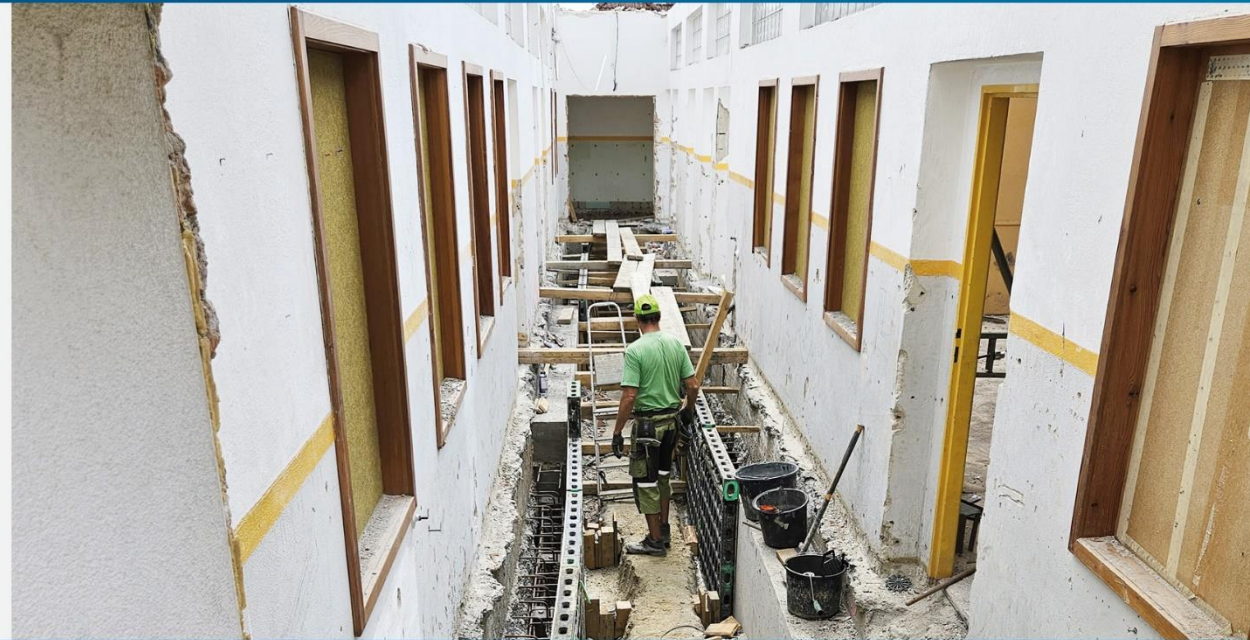


Stavební práce.






Stavební práce.

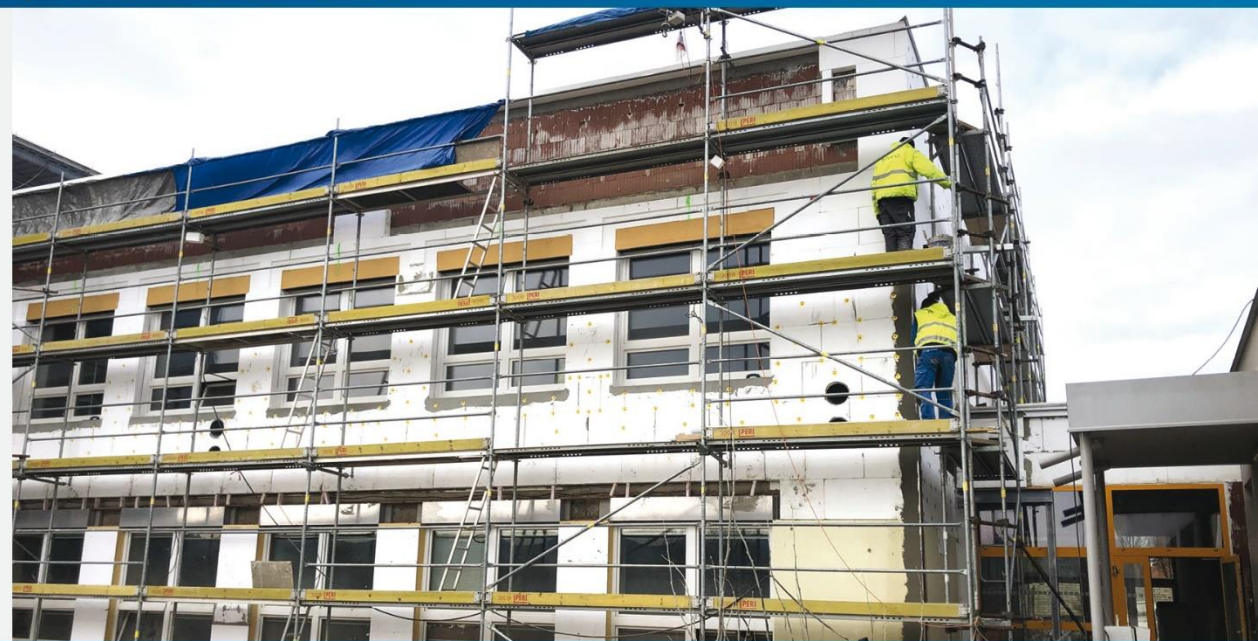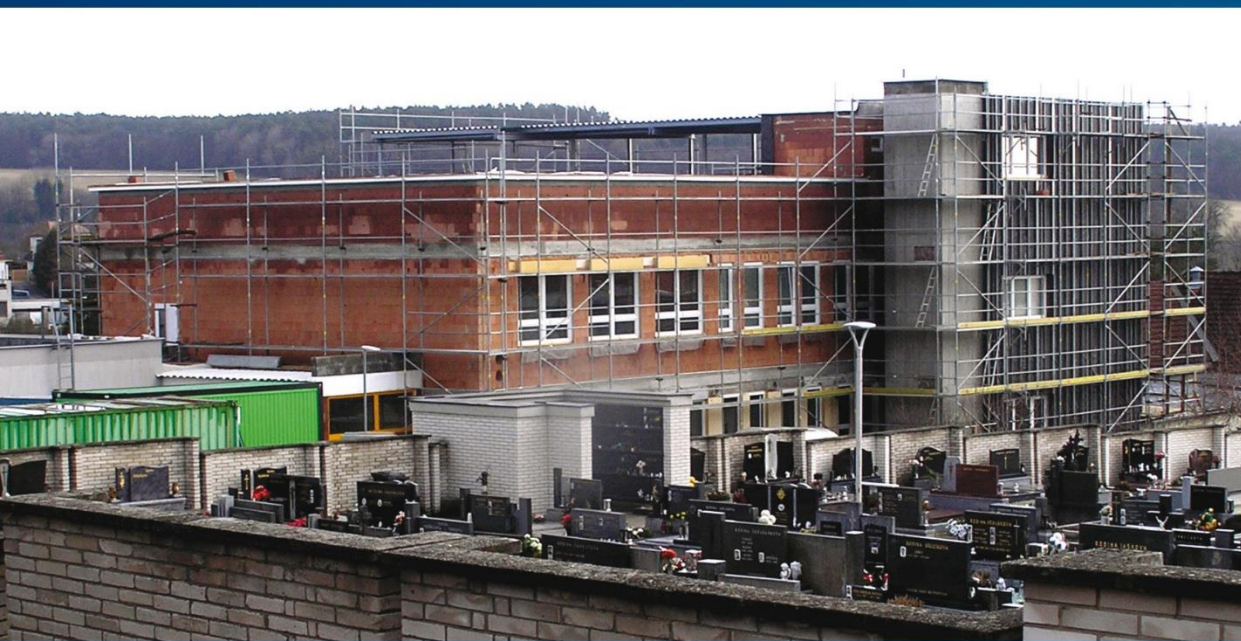



V pátek 30. srpna 2024 byla škola představena veřejnosti.

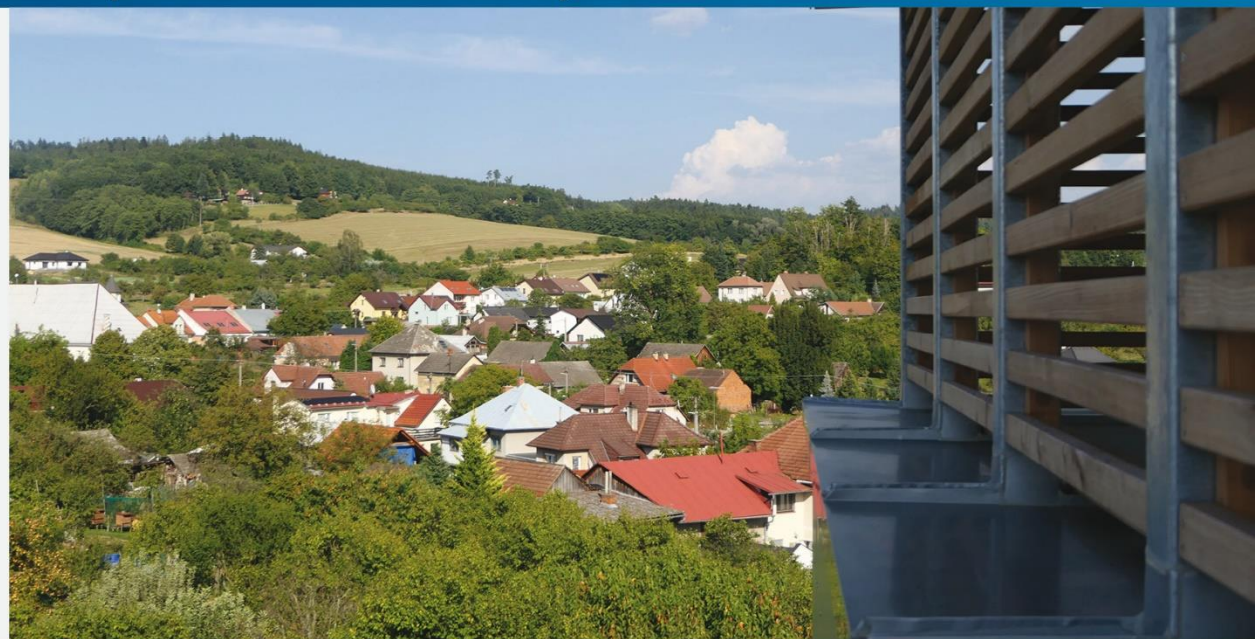




V pátek 30. srpna 2024 byla škola představena veřejnosti.






V pátek 30. srpna 2024 byla škola představena veřejnosti.

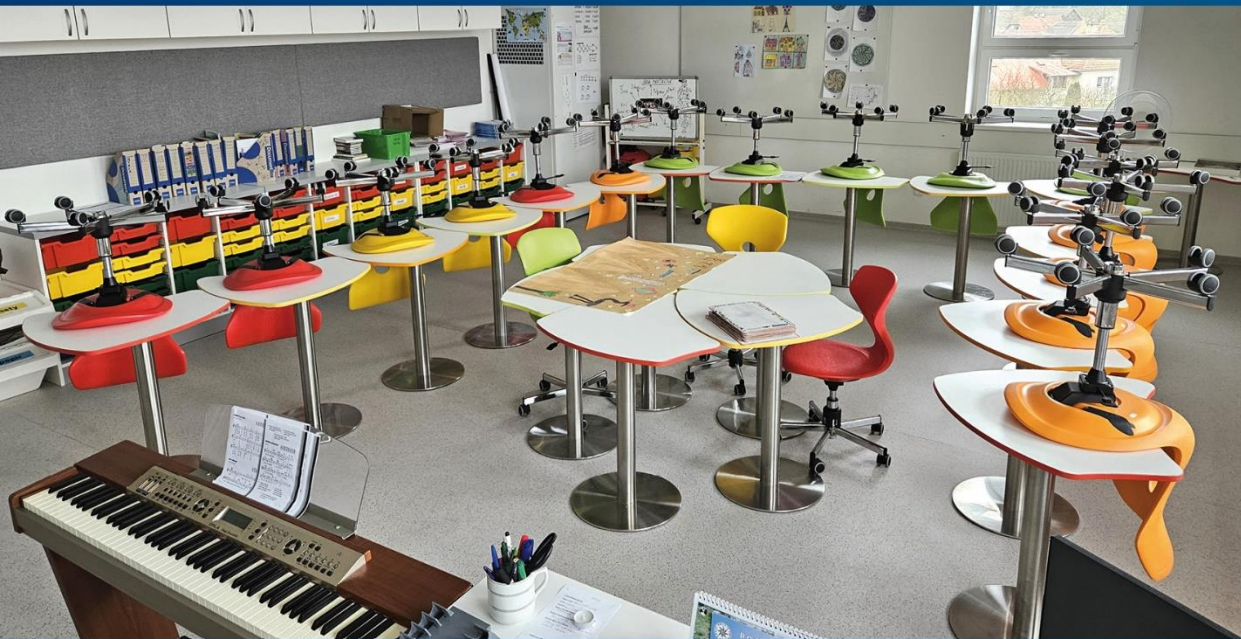



V pátek 30. srpna 2024 byla škola představena veřejnosti.

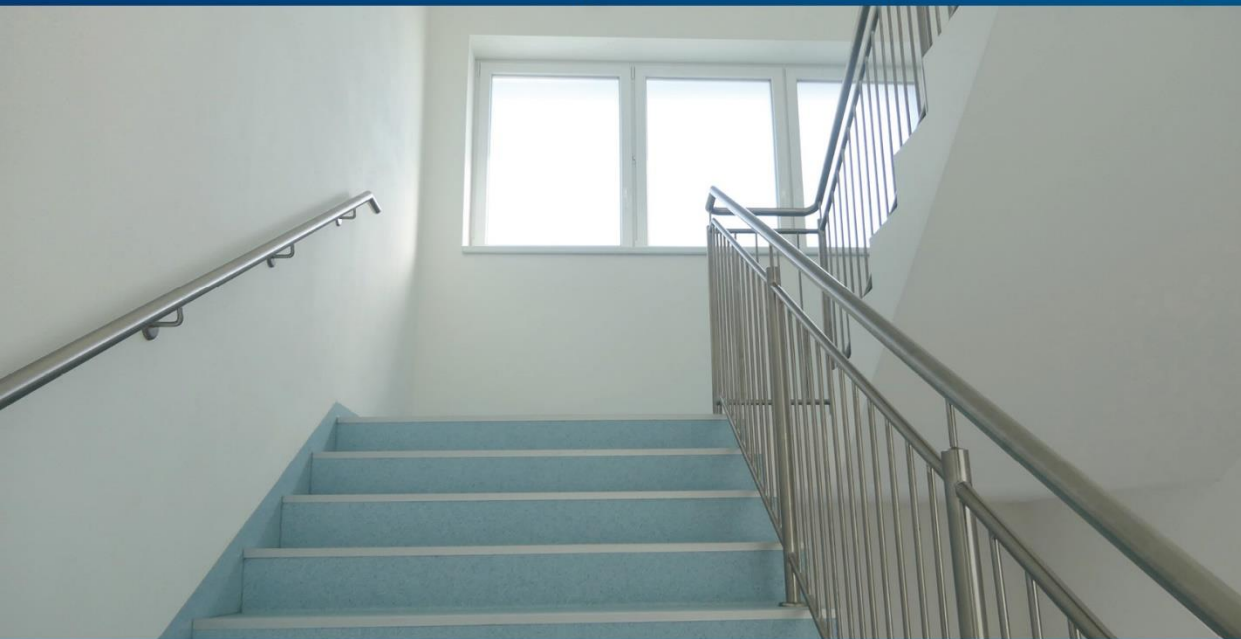

Květen 2023



Květen 2024




Připravované projekty

Revitalizace Víceúčelové budovy Lukov



Revitalizace Víceúčelové budovy Lukov

- **1. PP** zázemí pro spolky a kuchyň
- **1. NP** kuchyň, jídelna a knihovna
- **2. NP** zdravotní středisko

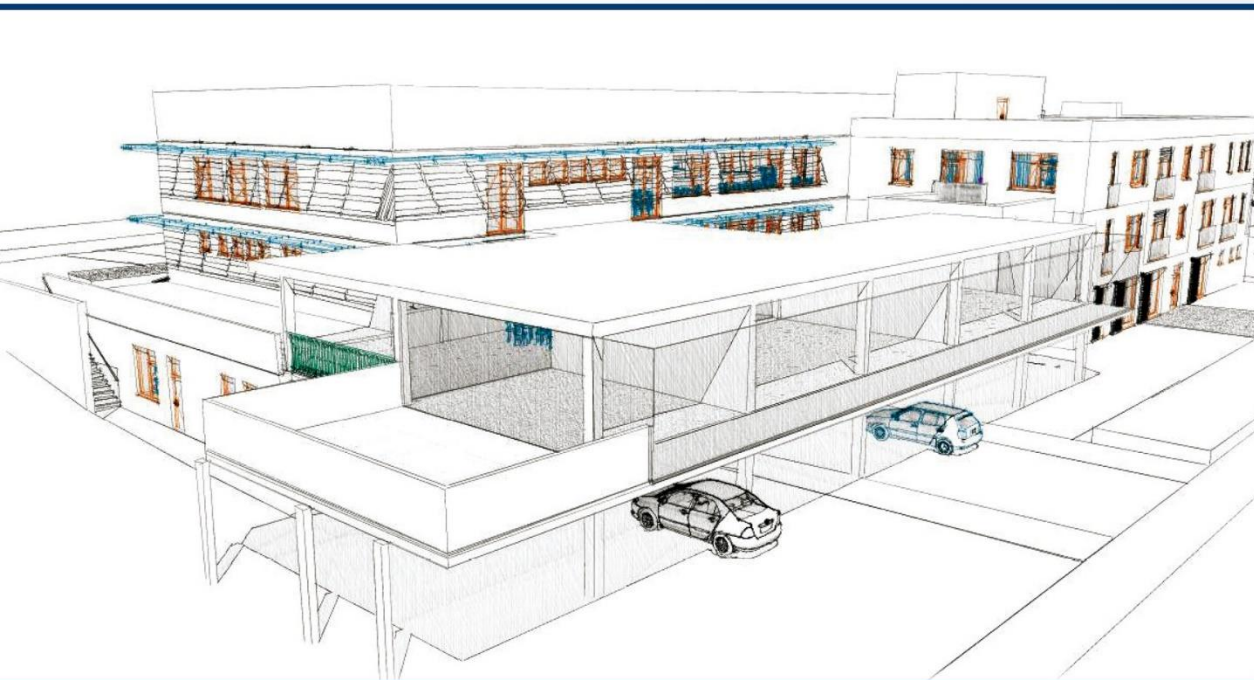

Bydlení pro seniory v Lukově



(pohled od východu)




Stávající stav (pohled od jihu)


Bydlení pro seniory v Lukově

Odhadovaná Kapacita stavby:

- **objekt A** 1+kk: 1. patro – 3×, 2. patro – 3×
2+kk: 1. patro – 3×, 2. patro – 3×
- **objekt B.1** 1+kk: 1. patro – 2×, 2. patro – 2×
2+kk: 1. patro – 2×, 2. patro – 2×
- **objekt C.1** 1+kk: 1. patro – 3×, 2. patro – 3×
2+kk: 1. patro – 3×, 2. patro – 3×
- **objekt B.2** 1+kk: 1. patro – 1×, 2. patro – 1×
2+kk: 1. patro – 1×, 2. patro – 1×
- **objekt C.2** 1+kk: 1. patro – 1×, 2. patro – 1×
2+kk: 1. patro – 1×, 2. patro – 1×
- **objekt D** 1+kk: 1. patro – 3×, 2. patro – 3×
2+kk: 1. patro – 3×, 2. patro – 3×

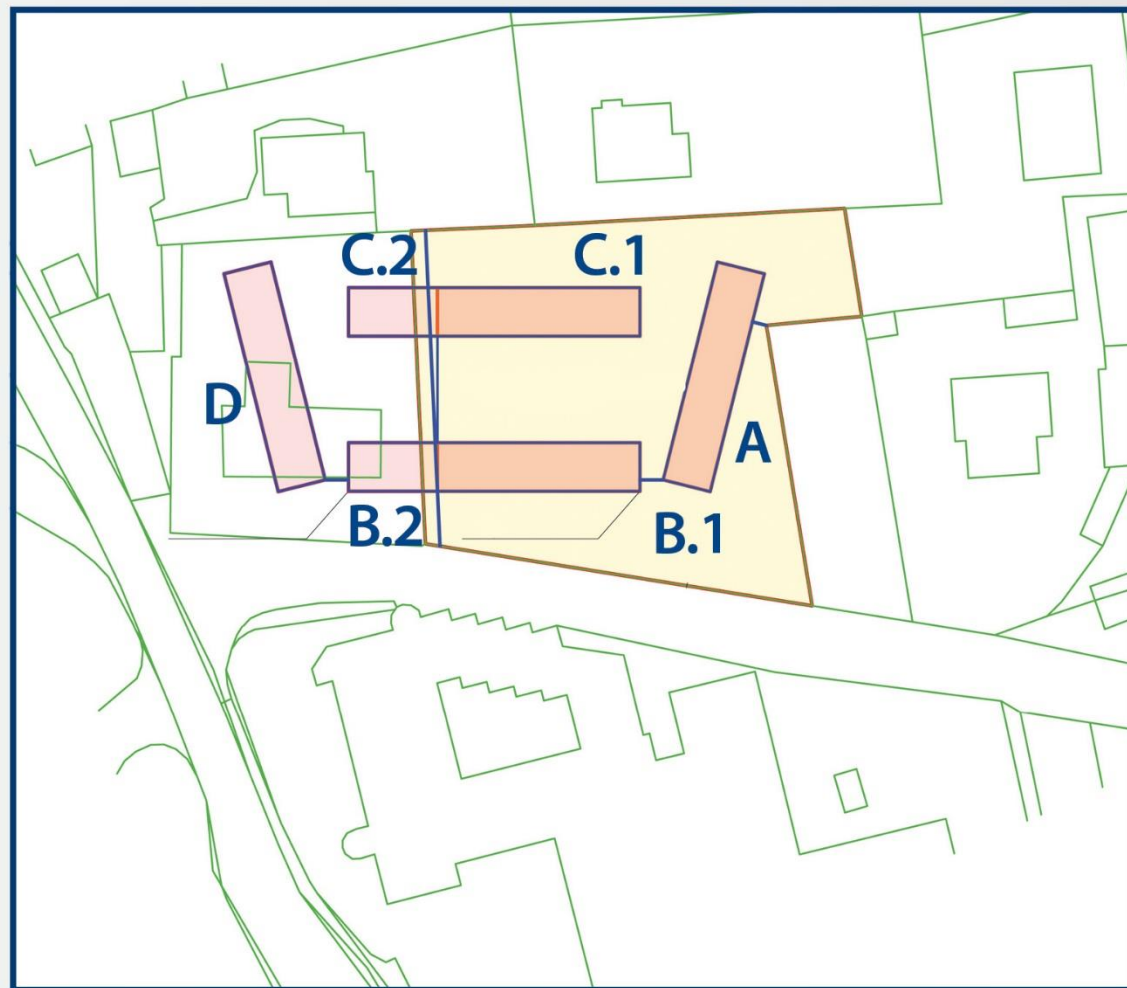

Bydlení pro seniory v Lukově

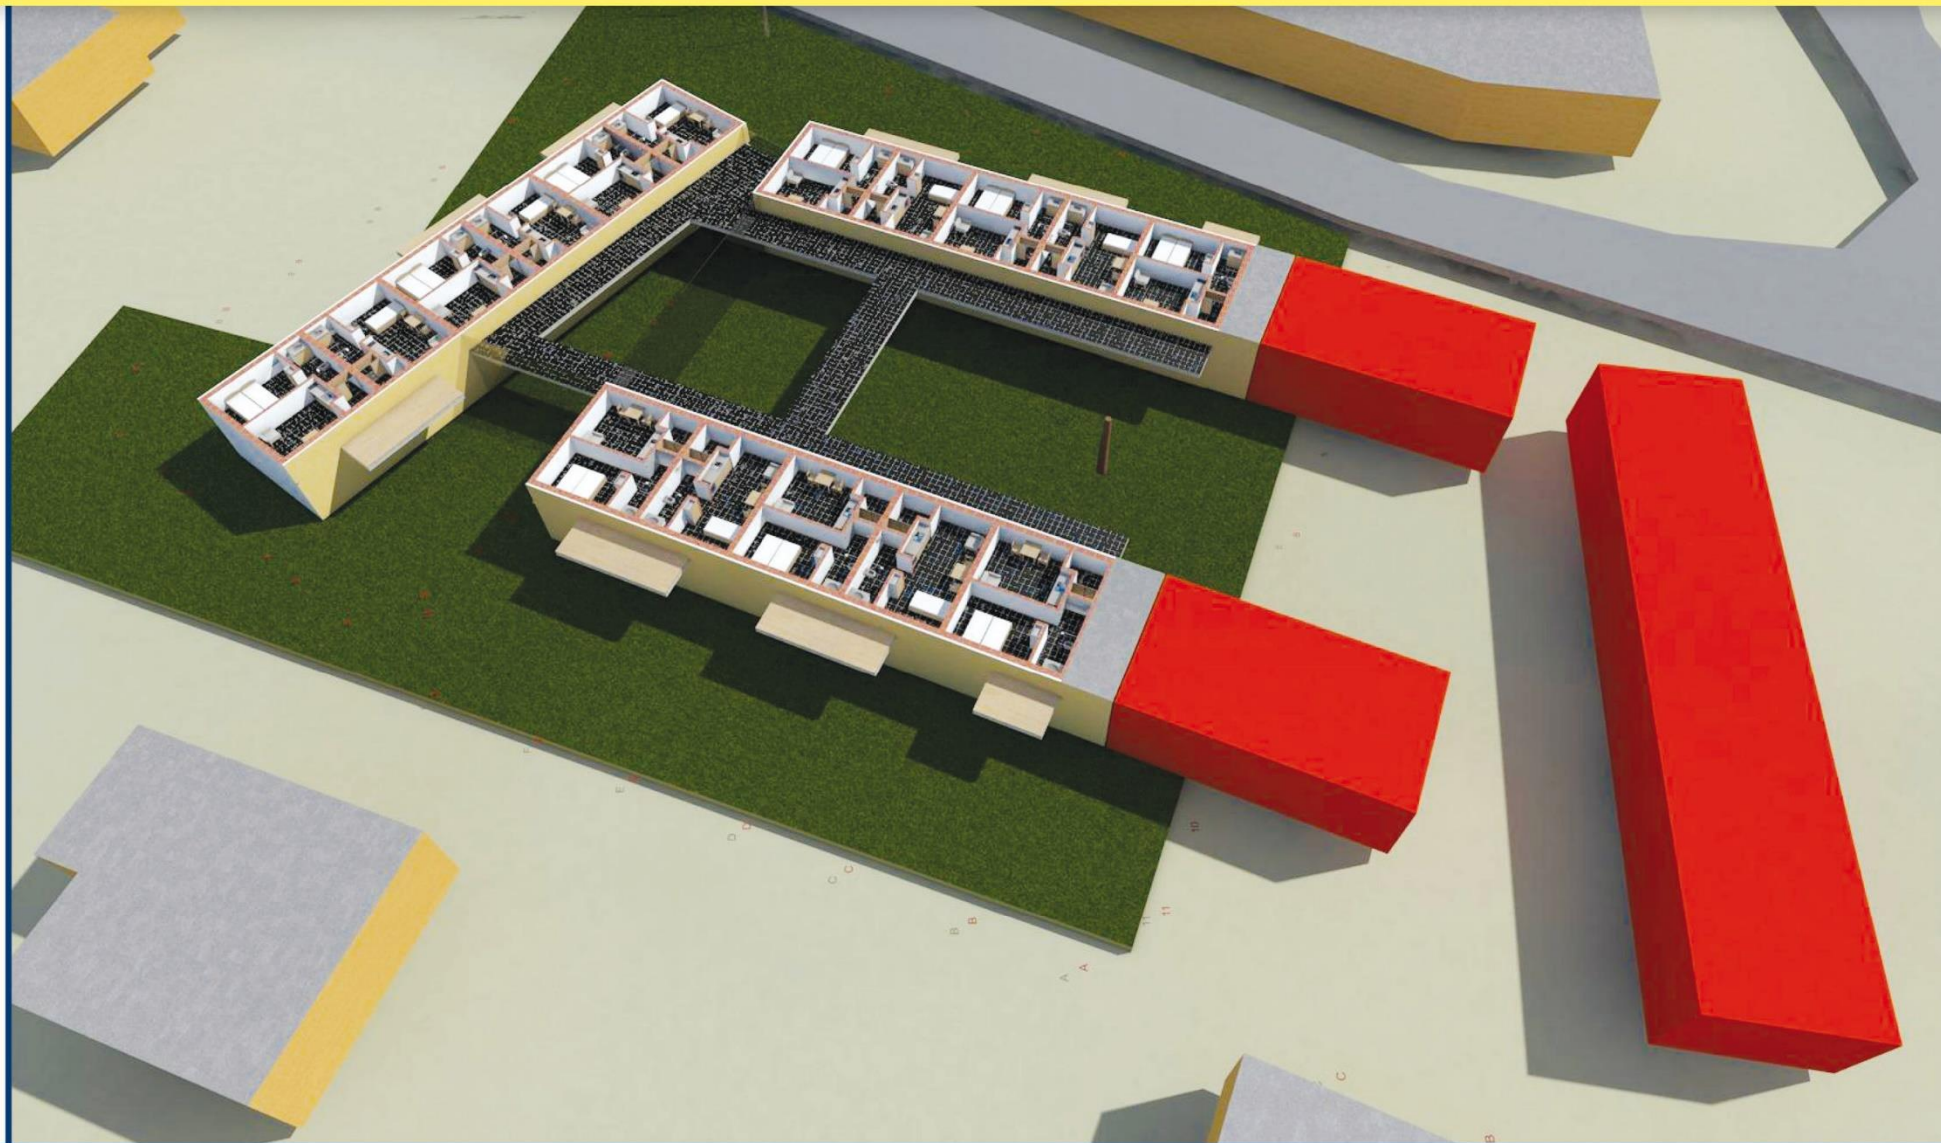



 www.lukov.cz

 [www.lukov.cz](https://www.facebook.com/www.lukov.cz)



 www.zslukovuzlina.edupage.org

 [zs.zs.754](https://www.facebook.com/zs.zs.754)
